



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y terminio	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Av. Colon y Av. Ahuehuetes	Saneamiento canal Nueva España	Del 04 de abril 2011	12,000 m3	70%	\$350,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Continuación Reyes Heroles	Saneamiento y desazolve vaso Valentín Gómez Farías	28/03/2011 al 26/04/2011	45,000 m3	100%	\$380,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Reyes Heroles y Rafael Molina	Saneamiento y desazolve vaso Balcones del 4	Del 04 de abril al 19 de mayo 2011	12,000 m ³	100%	\$650,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
ZONA 7 CURZ DELSUR	Av. Patria y José Ma. Méndez o.	Saneamiento y desazolve vaso 5 de Mayo	Del 28 de marzo al 26 de abril del 2011	60,000 m3	100%	\$590,000






Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y Termino	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Luis Covarrubias de Othon Blanco a C. 3 de mayo	Saneamiento canal del sur	Del 28 de marzo al 26 de abril del 2011	90,000 m3	100%	\$580,000

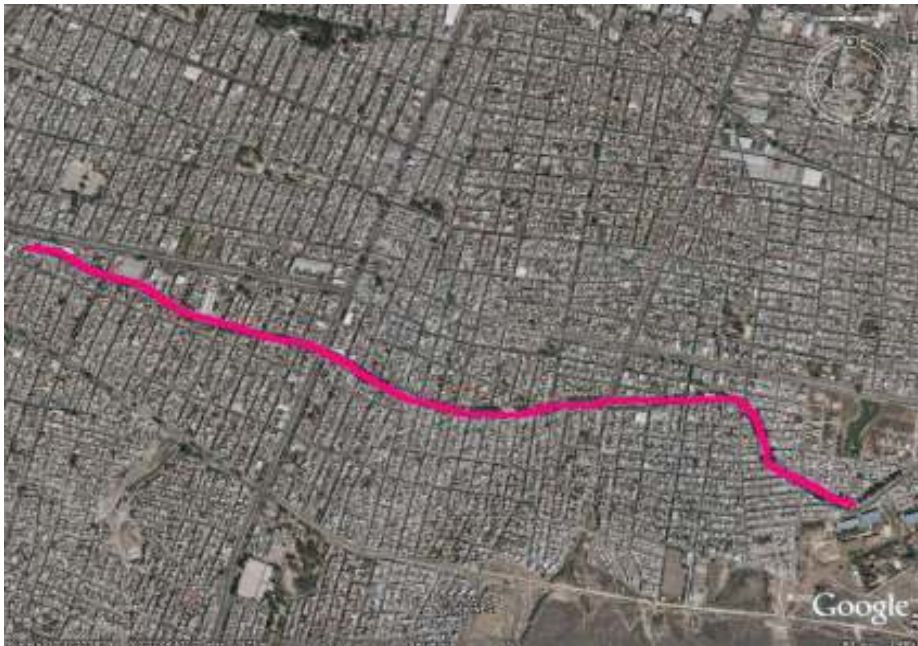




Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Luis Covarrubias y artes plásticas	Limpieza, desazolve y malla de protección canal Miravalle	Del 28 de marzo 2011 al 04 de junio 2011	1,534 ml	30%	\$249,000

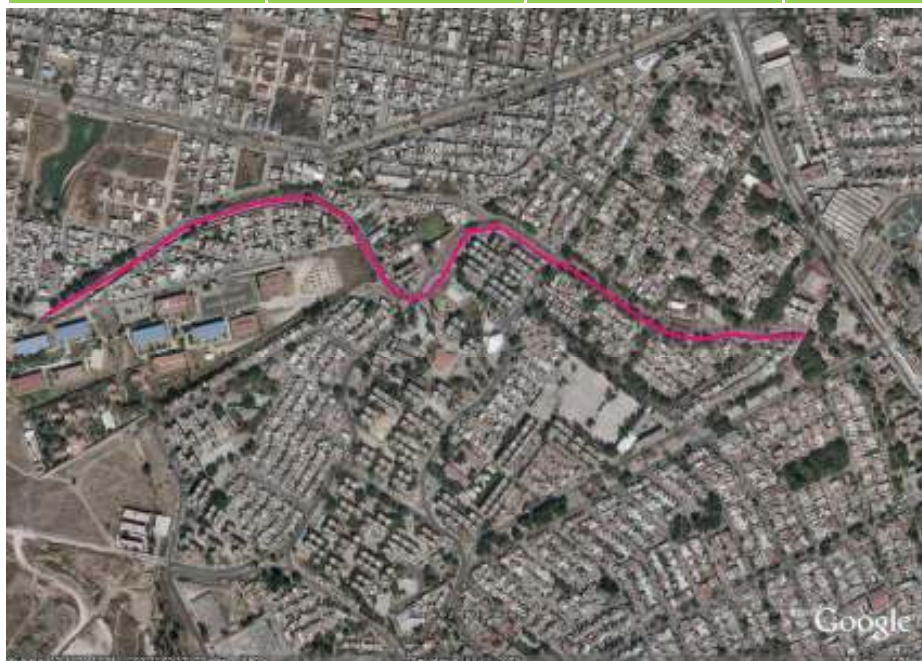



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Av. López de Legaspi e Higerillas	Canal pluvial interconector parque Liberación	Del 25 de abril al 13 de mayo 2011	464 ml	100%	\$70,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 7 cruz del sur	Lazaro Cardenas y calle 3 Col Ferrocarril	Saneario vaso regulador parque Liberación colocación de fuentes para oxigenación y obras de encausamientos	Del 11 al 17 de mayo 2011	188 612 m3	100%	2'600,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 2 Minerva	Constelación y Arcos	Muro de protección canal constelación	28 de marzo al 15 de junio 2011	330 ml	20%	\$870,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Volumen de reg. almacenamiento	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 4 Oblatos	Gavión de mamposteria en represa Cienega de Mata	Hda. La Calera y Cienega de Mata	Del 28 de marzo al 03 de mayo 2011	7,000 m3	100%	\$180,000





Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
ZONA 5 Olimpica	Juan R. Zavala y Belisario Domínguez	Canal san Ramón	Del 06 al 09 de junio 2011	530 ml	0%	\$60,000






Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 3 Huentitan	Av. Normalistas	Muro de protección en canal pluvial Normalistas	Del 28 de marzo al 03 de mayo 2011	1,790 m	100%	\$510,000

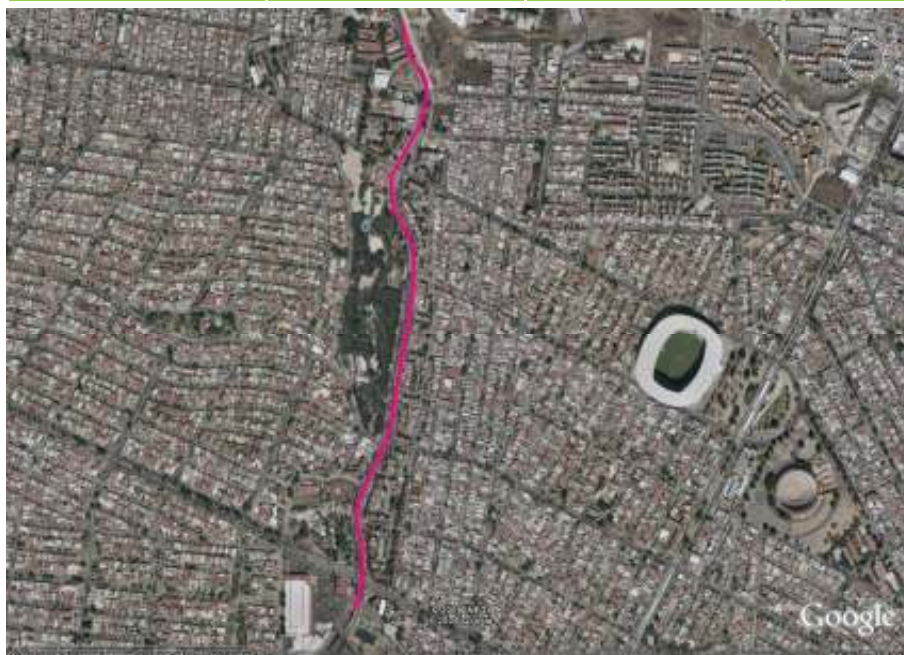



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
ZONA 5 Olimpica	Canal entre Monte Parnasoy Calzada Independencia Norte	Canal La Federacha	Del 17 al 27de mayo 2011	503 ml	100%	\$85,000






Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio y termino	Longitud M. L.	% de avance físico	Inversión estimada
Zona 3 Huentitan	C. Diagonal La drillera y Periférico Nte.	Canal El Jagüey	Del 27 de Mayo al 04 de junio 2011	820 ml	30%	\$220,000

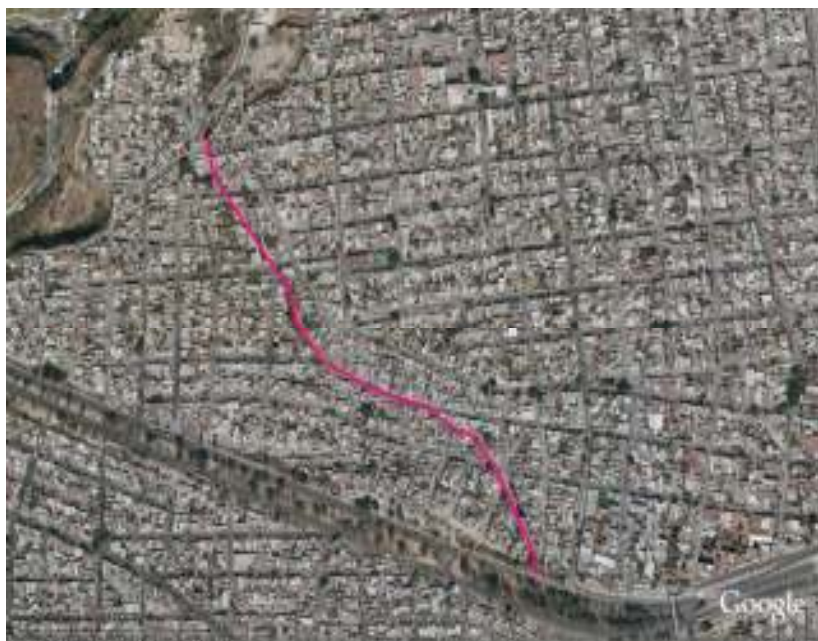



Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

Guadalajara Jalisco, Secretaria de obras publicas
Programa de desazolve y limpieza de cauces

