




SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

# PROGRAMA DE ACCIONES INSTITUCIONALES TEMPORAL DE LLUVIAS 2011

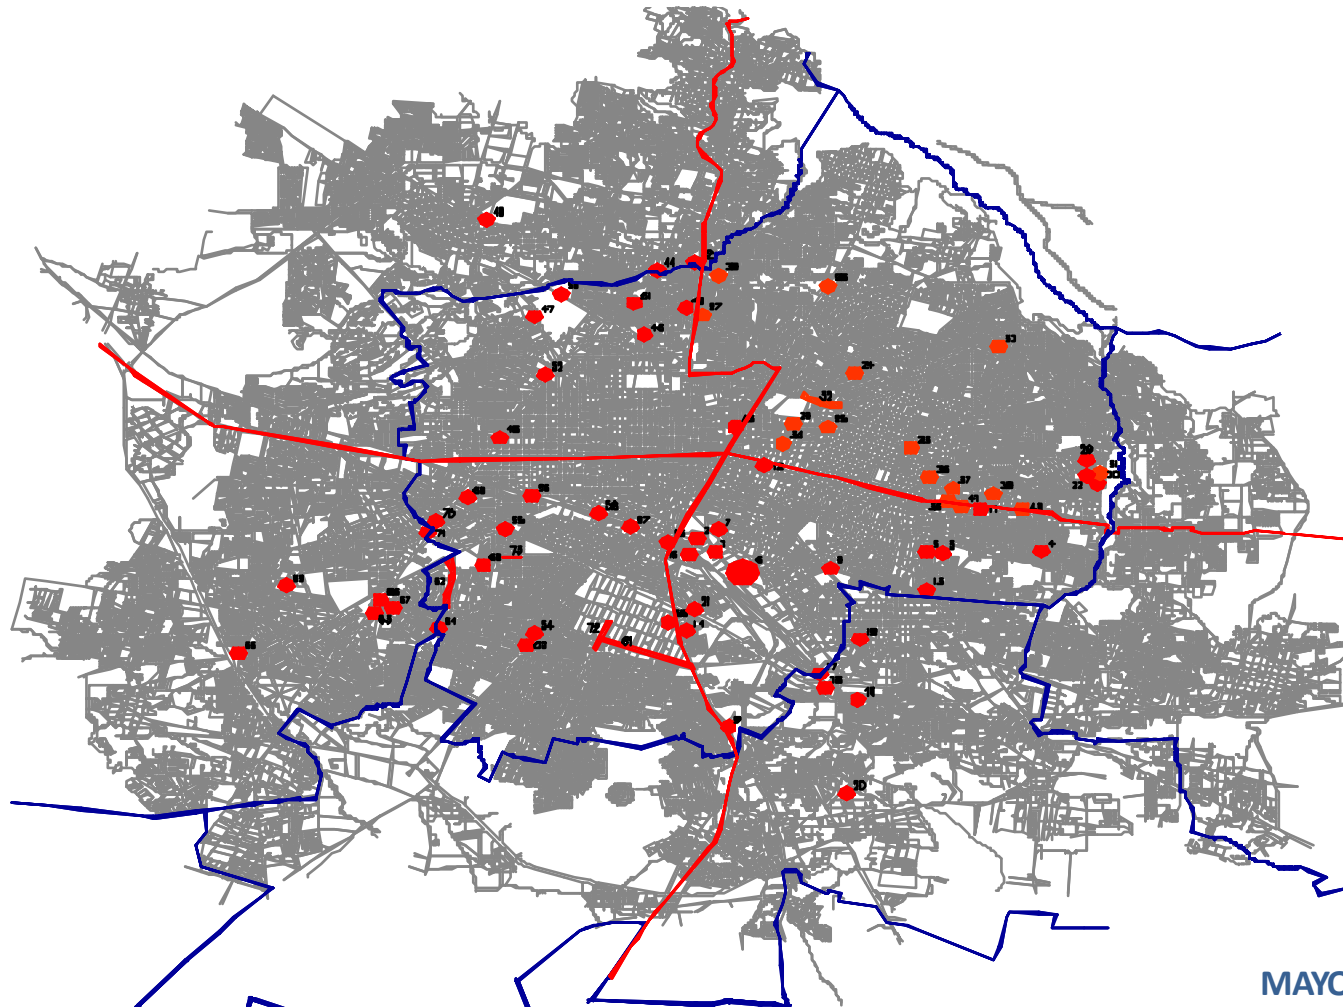


MAYO DE 2011



## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL CANAL LAS PINTAS, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONTROL DE LAS AGUAS BRONCAS DE LA CUENCA DEL AHOGADO.**

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Tlaquepaque y Tlajomulco, Jalisco	Canal Las Pintas	Eliminación de descargas que permiten el ingreso de aguas brongcas a la Presa las Pintas para mitigar las inundaciones en la parte baja de la Cuenca.	10/10/10	22/04/11	100%	\$12,000,000.

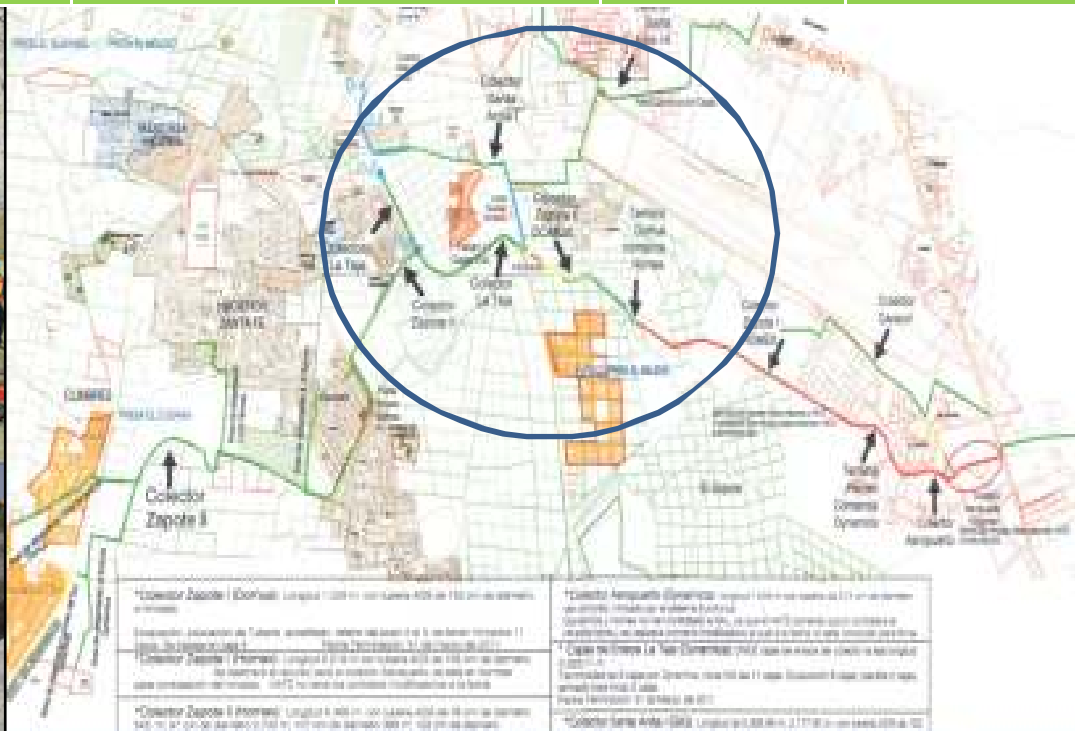



## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE EN CANALES CANAL LAS PINTAS

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Tlaquepaque, Jalisco	Col. Las Pintas	Desazolve del canal Las Pintas	06/04/11	15/05/11	100%	\$3,628,742.22





## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE EN PRESA LAS PINTAS

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Tlaquepaque, y El Salto, Jalisco	Col. Las Pintas	Desazolve de la presa Las Pintas	14/03/11	30/04/11	100%	\$2,787,702.00






## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### RECUPERACION DEL EMBALSE PARA APROVECHAMIENTO DE TEMPORAL DE LLUVIAS Y MITIGACION DE INUNDACIONES AGUAS ABAJO DEL EMBALSE

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Municipio de Tlaquepaque.	Col. Las Pintas	Saneamiento y recuperación de Espacio, aprovechamiento de agua y control de inundaciones en Las Pintas.	15/07/10	15/07/2011	80%	\$ 10,000,000

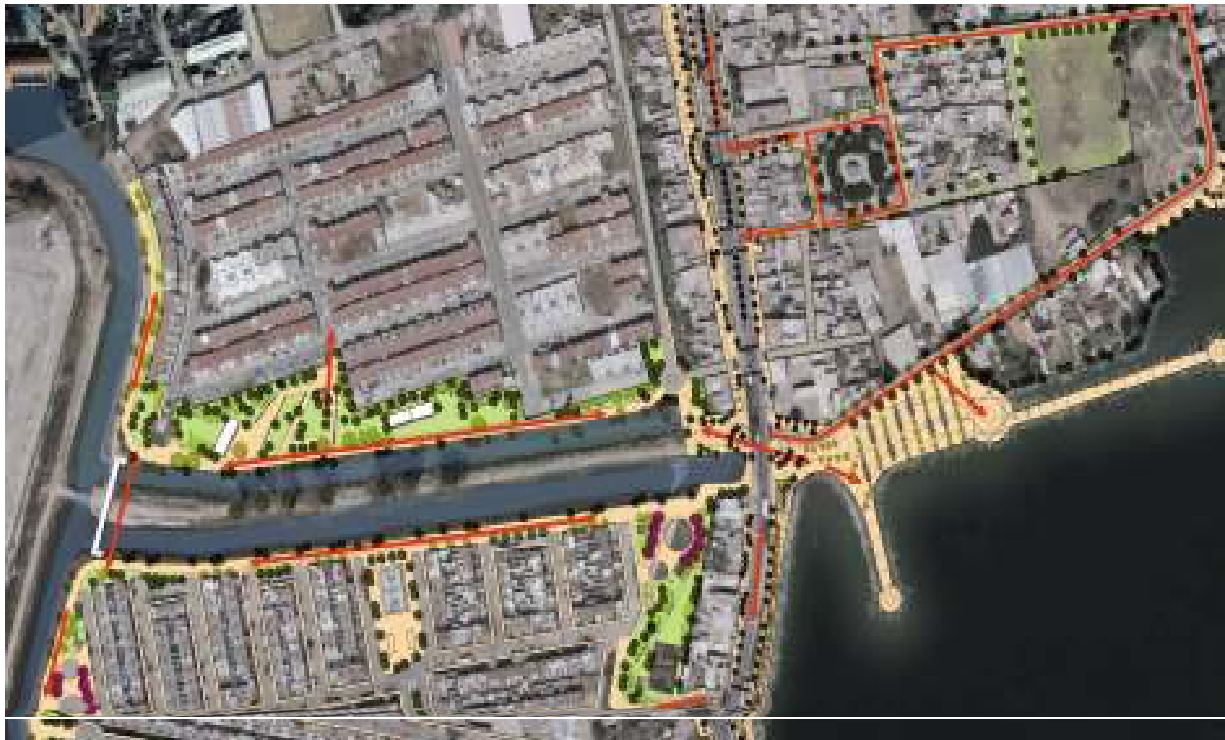



## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE EN CANALES URBANOS. CANAL SANTA CATALINA.

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Zapopan, Jalisco	Av. Santa Catalina entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Tepeyac	Desazolve del canal (vaso regulador) Santa Catalina, tramo Av. Lázaro Cárdenas - Av. Tepeyac, en la colonia Lomas de Guadalupe, Zapopan, Jalisco	04/04/11	28/05/11	100%	\$1,039,935.80





## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE EN CANALES. CANAL TCHAIKOVSKY.

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Zapopan, Jalisco	Av. Tchaikovsky, entre Av. Guadalupe y Av. Tepeyac	Desazolve del canal Tchaikovsky tramo Av. Guadalupe - Av. Tepeyac, Zapopan, Jalisco	04/04/11	28/05/11	100%	\$634,462.06





## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE EN CANALES. CANAL LAS PALMAS –ZONA AV. PATRIA.

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Zapopan, Jalisco	Fracc. Las Palmas	Desazolve del canal Las Palmas, zona Av. Patria, Zapopan, Jalisco	04/04/11	15/06/11	70%	\$1,227,337.92







## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
OBRA DE PROTECCION CLINICA ISSSTE Y COLONIA FOVISSSTE ESTADIO  
(CALZADA INDEPENDENCIA ENTRE IGUALDAD Y FRATERNIDAD).**

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Guadalajara, Jalisco	Colonia Fovissste Estadio	Construcción de colector con tubería de 72" de diam. Para el desalojo de aguas pluviales de la Calz. Independencia y calle Fraternidad	19/05/2011	21/07/2011	10%	\$9,500,000





## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESAZOLVE DE 11 SIFONES INVERTIDOS BAJO LA LÍNEA II DE TREN LIGERO GUADALAJARA

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
ZMG	Av. Javier Mina	Desazolve de 11 Sifones bajo la línea 2 del tren ligero.	22/03/2011	03/06/2011	100	4.5 millones



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1) San Juan de Dios</li> <li>2) Intermedio del Oriente</li> <li>3) Abascal y Souza</li> <li>4) Manuel Doblado</li> <li>5) Aquiles Serdán</li> <li>6) Sebastián Allende</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7) Rivas Guillén</li> <li>8) Guelatao</li> <li>9) Plutarco E. Calles</li> <li>10) Túnez</li> <li>11) Gigantes</li> </ul> |
|--|---|






# Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES.

Desazolve de Estructuras de Captación y Rebombeo en 33 Pasos Viales.

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
ZMG	ZMG	Desazolve de Estructuras de Captación y Rebombeo en 33 Pasos Viales Subterráneos	18/04/2011	03/06/2011	100	0.55 millones

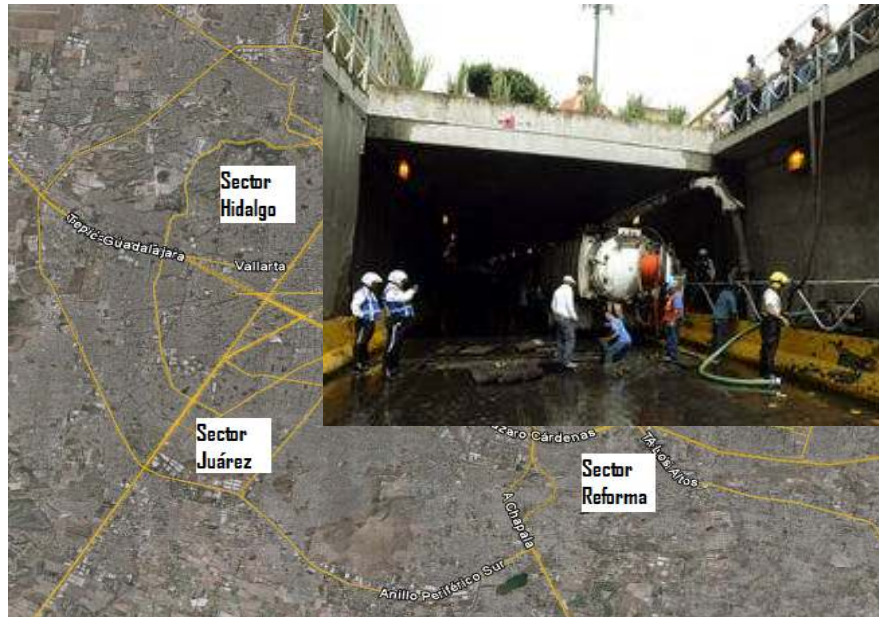




# Seguimiento al programa de trabajos en la cuenca de Atemajac, previos al temporal de lluvias 2011

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA DE DESAZOLVE 2011 DEL SIAPA EN ZMG

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Zona Metropolitana de Guadalajara	Diversas zonas de la ZMG	Desazolve de 15,500 bocas de tormenta / Zona Metropolitana de Guadalajara	01/04/2011	16/07/2011	60%	\$ 8,622,893.71

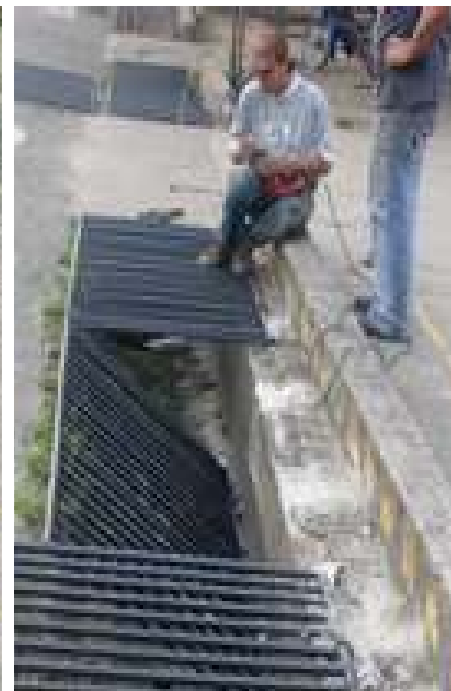



## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RESUMEN PROGRAMA DE DESAZOLVE POR CONTRATO /GENERAL

Contrato	Ubicación	Bocas de tormenta programadas	Azolve en M3	% de avance físico Real	Inversión estimada \$
SIAPA-DOB-IF-013/11	Sector Hidalgo	255 pza.	309.93	70 %	579,673.49
SIAPA-DOB-IF-016/11	Sector Juárez I	457 pza.	1,153.59	60 %	967,072.09
SIAPA-DOB-IF-017/11	Sector Juárez II	1,197 pza.	1,042.87	50 %	978,234.58
SIAPA-DOB-IF-018/11	Sector Libertad I	894 pza.	1,000.30	95 %	757,162.35
SIAPA-DOB-IF-020/11	Sector Libertad II	495 pza.	585.00	50 %	677,128.21
SIAPA-DOB-IF-010/11	Sector Reforma I	1284 pza.	1,898.50	75 %	618,924.85
SIAPA-DOB-IF-014/11	Sector Reforma II	500 pza.	600.00	30 %	655,598.14
			5,690.19	<b>GRAN TOTAL DESAZOLVE CONTRATADO</b>	5,233,793.71



**SIAPA**

## Seguimiento al programa de trabajos en las cuencas de Atemajac y El Ahogado, previos al temporal de lluvias 2011

### RESUMEN DE ACCIONES 2011

Localidad	Ubicación	Descripción de la Obra	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% de avance físico promedio
ZMG	Localidad de las Pintas	Desazolve en canal y Presa Las Pintas	14/03/11	15/10/11	92
ZMG	Av. Tchaikovski, Av. Santa Catalina, Av. Las Palmas, Av. Patria	Desazolve de 7.1 km de Canales Pluviales Urbanos	01/05/2011	15/06/2010	90
ZMG	ZMG	Desazolve de 15,500 Bocas de Tormenta	01/04/2011	16/07/2011	47.5
ZMG	Av. Javier Mina	Desazolve de 11 Sifones Invertidos del Alcantarillado	22/03/2011	03/06/2011	100
ZMG	ZMG	Desazolve de Estructuras de Captación y Rebombeo en 33 Pasos Viales Subterráneos	18/04/2011	03/06/2011	100
Guadalajara, Jalisco	Colonia Fovisste Estadio	Colector de 72" de diam. para el desalojo de aguas pluviales en la Calzada Independencia, Fraternidad y San Efren.	19/05/2011	21/07/2011	10%

NOTA.- LOS PORCENTAJES ASUMEN UN VALOR PROMEDIO ENTRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN CADA RUBRO.



SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

# PROMIAP



**PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE AGUAS PLUVIALES  
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.**


**16 PROYECTOS ESTRUCTURALES**



# Proyectos PROMIAP

## SIAPA

1. Proyecto Colector Atemajac 829 mdp
2. Colector López de Legaspi 96 mdp
3. El Dean 81 mdp ( Legaspi)+Dean = 177 mdp)
4. Depósito San Rafael 35 mdp
5. Colector Plutarco Elías Calles 400 mdp (Sn Rafael + Plutarco= 435 mdp)
6. Depósito Parque Morelos 25 mdp
7. Depósito González Gallo 70 mdp
8. Arroyo Osorio 80 mdp
9. Depósito Revolución 38 mdp
10. Depósito Revolución Lázaro C. 140 mdp
11. Depósito El Sauz 30 mdp
12. Depósito Jardines de la Cruz 35 mdp
13. Depósito Tercer Milenio 30 mdp
14. Depósito Felipe Zetter 36 mdp
15. Depósito Polanco 35 mdp
16. Depósito López Mateos 55 mdp
17. Canal Santa Catalina (SEDEUR)

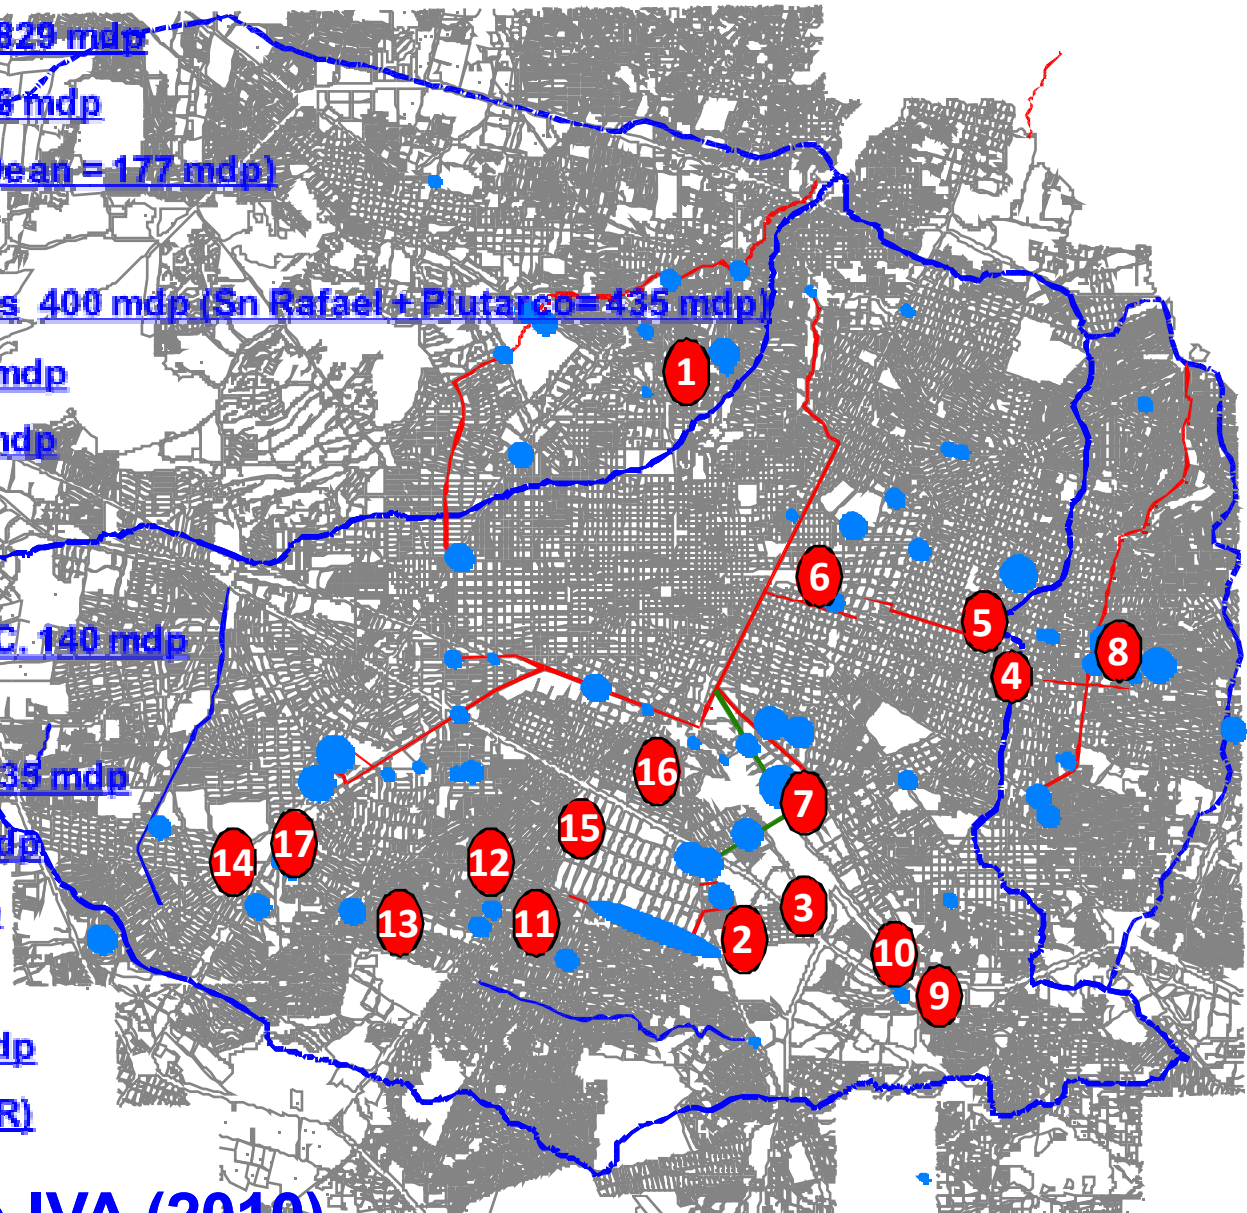

2,015 millones mas IVA (2010)





# SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## PROYECTO PROMIAP DEPOSITO EL DEAN

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Parque el Dean, Municipio de Guadalajara	Av. Lázaro Cárdena y calle 13 Sector Reforma	Adecuación de la Estructura de regulación natural existente, eliminando aguas residuales que contaminan el vaso, así como aumentar capacidad de captación, Intercepción, detención y regulación de los escurrimientos superficiales en la Zona sur de Guadalajara, ,	26/01/09	14/06/09	100%	\$81,000,000.00





**SIAPA**

## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

# PROYECTO PROMIAP DEPOSITO GONZALEZ GALLO

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Parque González Gallo, Municipio de Guadalajara	González Gallo y Salvador López Chávez Sector Reforma Guadalajara jal.	ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN LINEALES. Intercepción, detención y regulación de los escurrimientos superficiales en la colonia atlas, contribución a la mitigación en las partes bajas de la cuenca San Juan de de Dios	19/01/09	07/06/09	100%	\$ 70,000,000.00






SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**COLECTOR RUBÉN DARÍO Y  
ADECUACIÓN DEL CANAL ATEMAJAC**

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	% de avance físico	Inversión estimada
Guadalajara, Jalisco	Col. Providencia y Canal Atemajac	Proyecto de conducción de escurrimientos pluviales.	29/11/10	20/04/11	100%	TÚNEL: \$249,739,000 CANAL: \$ 532,858,000

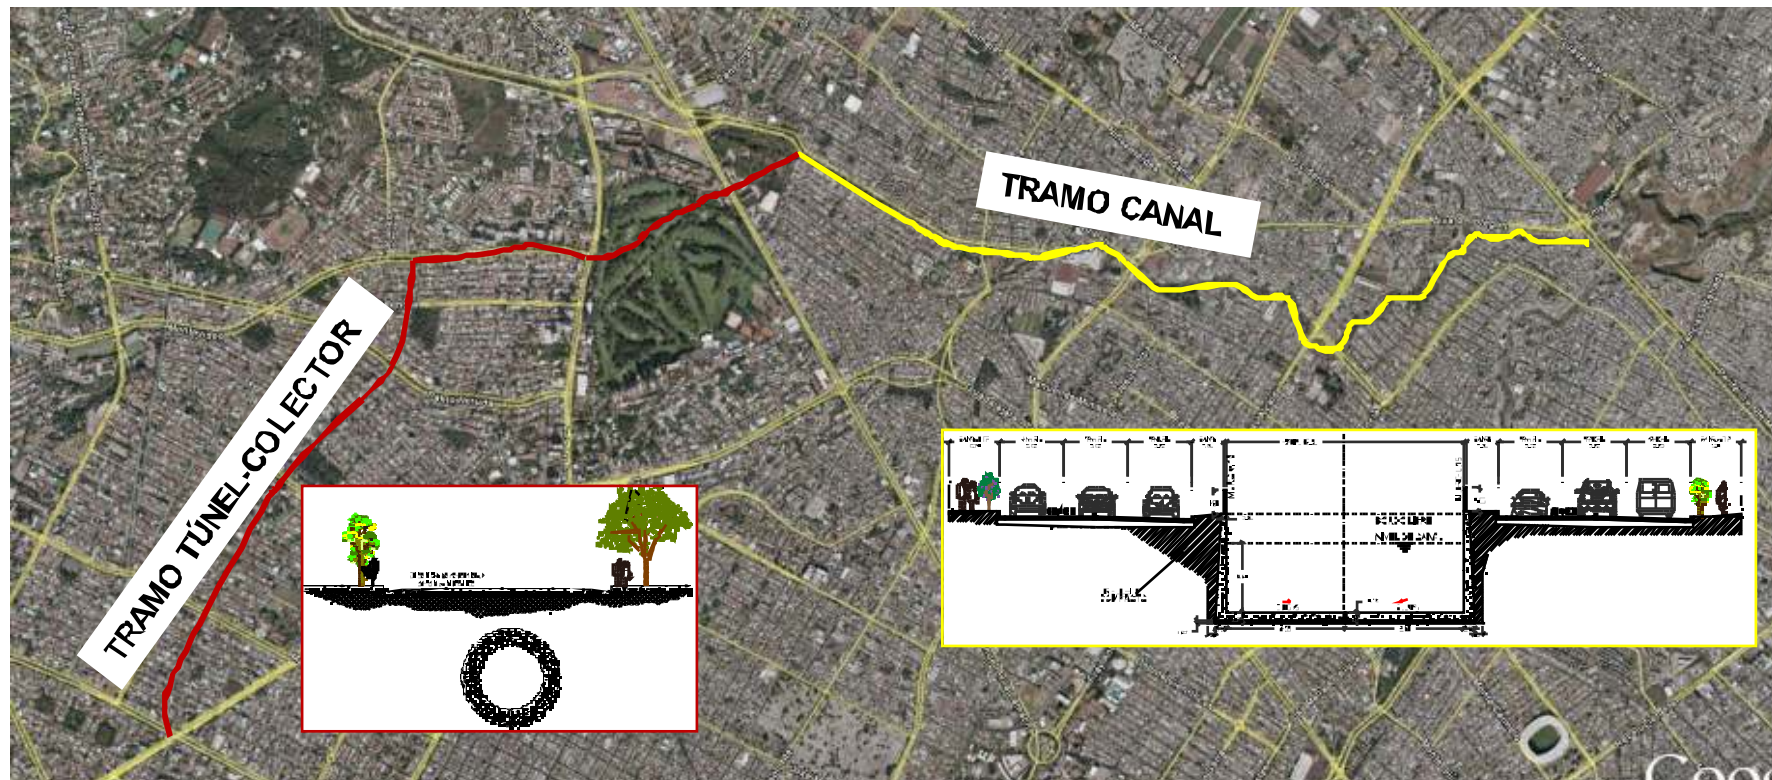



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Localidad	Ubicación	Descripción de la obra	Inversión estimada
Tlaquepaque y Tlajomulco, Jalisco	Canal Las Pintas	Eliminación de descargas que permiten el ingreso de aguas brancas a la Presa las Pintas para mitigar las inundaciones en la parte baja de la Cuenca.	\$12,000,000.00
Tlaquepaque, Jalisco	Col. Las Pintas	Desazolve del canal Las Pintas	\$3,628,742.22
Tlaquepaque, y El Salto, Jalisco	Col. Las Pintas	Desazolve de la presa Las Pintas	\$2,787,702.00
Municipio de Tlaquepaque.	Col. Las Pintas	Saneamiento y recuperación de Espacio, aprovechamiento de agua y control de inundaciones en Las Pintas.	\$ 10,000,000.00
Zapopan, Jalisco	Av. Santa Catalina entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Tepeyac	Desazolve del canal (vaso regulador) Santa Catalina, tramo Av. Lázaro Cárdenas - Av. Tepeyac, en la colonia Lomas de Guadalupe, Zapopan, Jalisco.	\$1,039,935.80
Zapopan, Jalisco	Av. Tchaikovsky, entre Av. Guadalupe y Av. Tepeyac	Desazolve del canal Tchaikovsky tramo Av. Guadalupe - Av. Tepeyac, Zapopan, Jalisco	\$634,462.06
Zapopan, Jalisco	Frac. Las Palmas	Desazolve del canal Las Palmas, zona Av. Patria, Zapopan, Jalisco	\$1,227,337.92
Guadalajara, Jalisco	Colonia Fovissste Estadio	Construcción de colector con tubería de 72" de diam. Para el desalojo de aguas pluviales de la Calz. Independencia y calle Fraternidad	\$9,500,000.00
Zona Metropolitana de Guadalajara	Av. Javier Mina	Desazolve de 11 Sifones Invertidos bajo la línea 2 del tren ligero.	\$ 4,500,000.00
Zona Metropolitana de Guadalajara	ZMG	Desazolve de Estructuras de Captación y Rebombeo en 33 Pasos Viales Subterráneos	\$ 550,000.00
Zona Metropolitana de Guadalajara	Diversas zonas de la ZMG.	Desazolve de 15,500 bocas de tormenta / Zona Metropolitana de Guadalajara.	\$ 8,622,893.71
		<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA</b>	<b>\$54,491,073.71</b>
